

AVANCE MENSUAL DE OBRA SEPTIEMBRE 2019 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

El corazón de México

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Presidenta Municipal



30 DE SEPTIEMBRE 2019

INDICE GENERAL

1. AVANCE FÍSICO DE OBRAS POR CONTRATO
2. TRABAJOS EJECUTADOS DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (DPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)
3. TRABAJOS EJECUTADOS DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (DPTO. INFRAESTRUCTURA URBANA)
4. TRABAJOS EJECUTADOS DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DPTO. DE INFRAESTRUCTURA URBANA (RESCANTANDO NUESTRA ARQUITECTURA)
5. TRABAJOS EJECUTADOS DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DPTO. DE INFRAESTRUCTURA URBANA (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS)
6. OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR INICIAR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO

DM-0238-2017

**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO, C. EL ZARCO S/N, FRACC.
MUNICIPIO LIBRE**

CONTRATISTA:

GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO 2018

TECHO FINANCIERO: \$ 6´170,478.82

AVANCE FISICO REAL 87.00%





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0031-2019 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO (FUENTE, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO), CALLE EL ZARCO, FRACC. MUNICIPIO LIBRE

CONTRATISTA: L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL 2019

FECHA DE TERMINO: 25 DE JULIO 2019

TECHO FINANCIERO: \$ 2'921,460.56

AVANCE FISICO REAL 95.00%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019


SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0056-2019 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO (MUROS DE CONTENCIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MEDIA TENSIÓN Y ALIMENTADORES), CALLE EL ZARCO, FRACC. MUNICIPIO LIBRE

CONTRATISTA: I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO

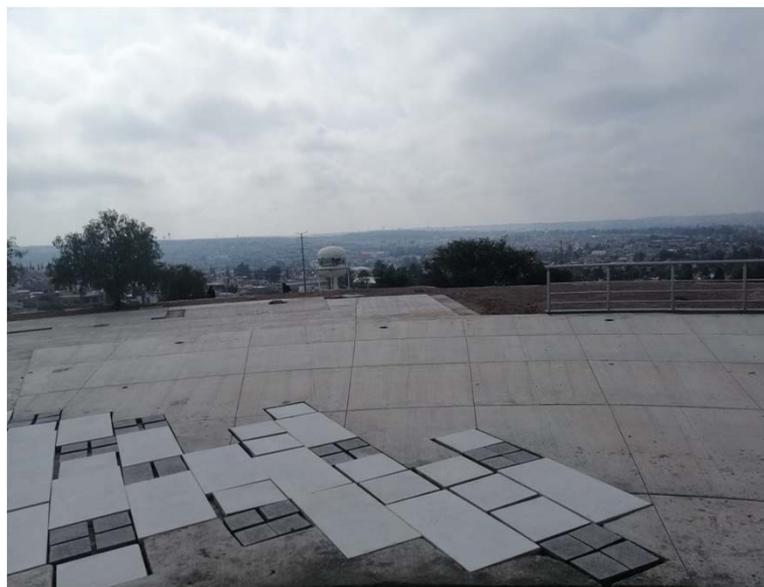

FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO 2019

FECHA DE TÉRMINO: 16 DE JULIO 2019

TECHO FINANCIERO: \$ 2'170,345.31

AVANCE FISICO REAL 97.00%





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO BIANUALES

DM-0142-2018 CONVIVENCIA FERROVIARIA ETAPA II (META 1), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,
GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE CRUCE EZEQUIEL A.
CHÁVEZ SUR .

CONTRATISTA: SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE 2018
TECHO FINANCIERO: \$ 2'569,522.69

AVANCE FISICO REAL **96.00%**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2018/2019

DM-0177-2018/2019 CONVIVENCIA FERROVIARIA ETAPA II (META 03), BANQUETAS, RAMPAS Y ANDADORES, TRAMO DE AV. LÓPEZ MATEOS A EZEQUIEL A. CHÁVEZ

CONTRATISTA: SILJA INGENIERIA, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL 2019
FECHA DE TERMINO: 22 DE JULIO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'503,680.44

AVANCE FISICO REAL 97.00%





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0026-2019 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO "B" AV. CONVENCION DE 1914 OTE. Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, FRACC. C.T.M.

CONTRATISTA: JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.




FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL 2019

FECHA DE TERMINO: 02 DE JULIO 2019

TECHO FINANCIERO: \$ 1'191,239.90

AVANCE FISICO REAL 82.00%





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0070-2019 AMPLIACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EL REFUGIO, AV. SIGLO XXI SUR S/N

CONTRATISTA: I.C. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO



FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 24 DE SEPTIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'449,330.33

AVANCE FISICO REAL 70.00%





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0080-2019 REHABILITACIÓN DE MERCADO TERÁN 2ª. ETAPA, CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE ARTEAGA, ZONA CENTRO.

CONTRATISTA: COTECO, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 07 DE AGOSTO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 2'146,556.71

AVANCE FISICO REAL 75.00%



10



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

DM-0094-2019 REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES – SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21

CONTRATISTA: SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.



FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE AGOSTO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'015,831.35

AVANCE FISICO REAL 83.00%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019


SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

**DM-0148-2019 ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL,
INSTALACIONES C-4.**

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIETALES PRAGARBA, S.A DE C.V.

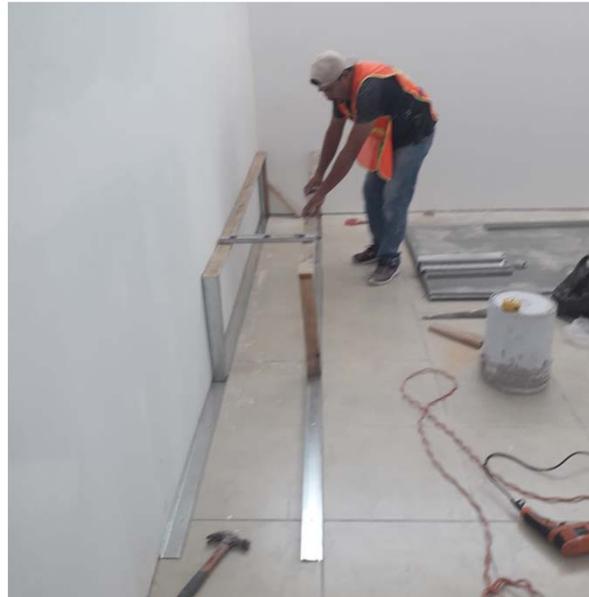

FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 25 DE SEPTIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 472,250.20

AVANCE FISICO REAL 92.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0169-2019 ALBERCA BOULEVARES, (SANITARIOS HOMBRES, SANITARIOS MUJERES, BODEGA), CALLE JESÚS SOTELO INCLÁN, FRACC. BOULEVARES 1ª. SECC.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA DE TÉRMINO: 04 DE NOVIEMBRE 2019

TECHO FINANCIERO: \$ 1'802,561.33

AVANCE FISICO REAL 25.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

**FORTAMUNDF-0166-2019 REHABILITACIÓN ALBERCA BOULEVARES, CALLE JESÚS SOTELO INCLÁN, FRACC.
BOULEVARES 1ª. SECC.**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE TÉRMINO: 04 DE NOVIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'528,809.90

AVANCE FISICO REAL 30.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FORTAMUNDF-0161 -2019 REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDAS II, CALLE HACIENDA MESILLA ESQ. HACIENDA LA GUAYANA, FRACC. HACIENDAS DE AGUASCALIENTES 1ª. SECC.

CONTRATISTA: VELASER, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 259,752.07

AVANCE FISICO REAL 25.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FORTAMUNDF-0162 -2019 REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO OJOCALIENTE III (LÍNEA VERDE), AV. POLIDUCTO, ESQ. CARR. A NORIAS DE OJOCALIENTE, FRACC. OJOCALIENTE 3ª. SECC.

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 126,377.16

AVANCE FISICO REAL 28.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FORTAMUNDF-0163 -2019 REHABILITACIÓN DE PARQUE OJOCALIENTE III (LÍNEA VERDE), CALLE SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO, ESQ. CALLE LA BOQUILLA , FRACC. OJOCALIENTE 3ª SECC.

CONTRATISTA: VELASER, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 190,158.92

AVANCE FISICO REAL 20.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FORTAMUNDF-0164 -2019 REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PENSADORES MEXICANOS, AV. SIGLO XXI, ESQ. AV. PENSADORES MEXICANOS, PRIENTE, FRACC. PENSADORES MEXICANOS.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 31 DE AGOSTO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 14 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 613,846.13

AVANCE FISICO REAL 65.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FORTAMUNDF-0165 -2019 REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO SOLIDARIDAD I (8LÍNEA VERDE), AV. POLIDUCTO, ESQ. CALLE EDUCACIÓN, FRACC. SOLIDARIDAD 1ª. SECC.

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE TÉRMINO: 24 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 169,908.94

AVANCE FISICO REAL 15.00%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0091-2019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SAN BERNARDO, TRAMO: ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS , FRACC. LOS PERICOS.

CONTRATISTA: I.C. BAUTISTA RODHERICK PALACIOS



FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 26 DE AGOSTO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 2'605,847.64

AVANCE FISICO REAL 99.00%



20

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0127-2019 PAVIMENTO HIDRÁULICO, EDMUNDO GÁMEZ OROZCO, TRAMO: ENTRE PROL. EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y CALLE REFORMA, COM. CAÑADA HONDA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE SEPTIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 2'049,765.45

AVANCE FISICO REAL 88.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0128-2019

**PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA, RAMO: ENTRE CALLE EDMUNDO GÁMEZ
OROZCO Y CALLE INDEPENDENCIA, COM. CAÑADA HONDA.**

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO 2019

FECHA DE TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE 2019

TECHO FINANCIERO: \$ 1,200,987.30

AVANCE FISICO REAL 90.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0129-2019 PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CLAVEL, TRAMO: ENTRE L 3, M 10 Y CALLE NARDO, EJ. NORIAS DE PASO HONDO

CONTRATISTA: CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$2'937,151.30

AVANCE FISICO REAL 33.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0131-2019 PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE NARDO, TRAMO: ENTRE ANTIGUA CARRETERA A S.L.P. Y CALLE CLAVEL, EJ. NORIAS DE PASO HONDO

CONTRATISTA: MAGS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE SEPTIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'001,363.74

AVANCE FISICO REAL 99.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0134-2019 PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, TRAMO: ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COM. JALTOMATE

CONTRATISTA: L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.




FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 2'360,172.81

AVANCE FISICO REAL 90.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

FISMDF-0135-2019 PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TRAMO: ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, COM. JALTOMATE

CONTRATISTA: COPZA, S. DE R.L. DE C.V.

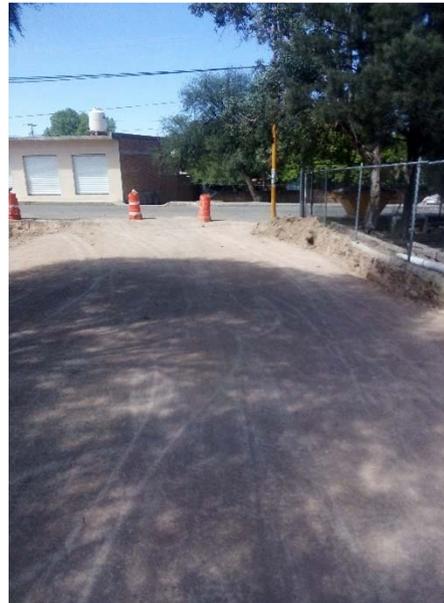

FECHA DE INICIO: 06 DE AGOSTO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 04 DE OCTUBRE 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'832,698.05

AVANCE FISICO REAL 82.00%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO
FISMDF-0117-2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 42 "NUEVA CREACIÓN", CALLE ISMAEL RODRÍGUEZ NEGRETE No. 601, REAL DEL SOL	JOSE PADILLA GONZALEZ, ARQ.	20 Jun 2019	09 Ago 2019	\$ 739,830.16	100%
FISMDF-0118-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA", CALLE TRABAJO No. 401, SOLIDARIDAD Fracc. 1a. Secc.	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.	02 Jul 2019	15 Ago 2019	\$ 934,729.45	98%
FISMDF-0119-2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES", CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESQ. CALLE JULIÁN MEDINA, INSURGENTES Fracc.	SINERGIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO CREO, S.A. DE C.V.	29 Jun 2019	12 Ago 2019	\$ 580,000.36	100%
FISMDF-0120-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "MÉXICO", CALLE COAHUILA No. 202, MEXICO Fracc.	IGNACIO JIMENEZ ARMAS, ARQ.	15 Jun 2019	20 Ago 2019	\$ 1,118,335.57	100%
FISMDF-0121-2019	MEJORAMIENTO D ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO FUENTES DÁVILA", CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC S/N, COM. OJO DE AGUA DE PALMITAS	CONSTRUURS, S.A DE C.V.	31 Ago 2019	14 Oct 2019	\$ 134,742.89	95%
FISMDF-0122-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ETV No. 103 "JOSÉ GUADALUPE POSADA", CALLE CARDENAL NO. 405, EL CONEJAL Com.	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	29 Jun 2019	12 Ago 2019	\$ 699,835.27	99%
FISMDF-0123-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 35 "JAIME SABINES", AV. DE LA SALUD, ESQ. PRÓCEROS DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc.	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V.	19 Jun 2019	20 Ago 2019	\$ 82,276.79	100%
FISMDF-0124-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "HUMBERTO RAMÍREZ DÍAZ", CALLE SAN PEDRO S/N, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.	URCOMA, S.A. DE C.V.	06 Jul 2019	19 Ago 2019	\$ 669,907.89	100%
FISMDF-0125-2019	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE X Y IV, CALLE VIDRIEROS S/N, MUNICIPIO LIBRE Fracc.	GC HIDROCALIDO, S.A. DE C.V.	06 Jul 2019	19 Ago 2019	\$ 724,923.89	100%
FISMDF-0126-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE IGUALA", CALLE POZO DE LA CRUZ No. 125, POZO BRAVO Fracc.	CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V.	03 Jul 2019	16 Ago 2019	\$ 869,993.24	100%
FISMDF-0132-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 34 "MAHATMA GANDHI", CALLE FERNÁN GONZÁLEZ DE ESLAVA, ESQUINA CON AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA. , VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V	05 Jul 2019	18 Ago 2019	\$ 1,123,141.94	100%
FISMDF-0133-2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 32 "FRANCISCO AGUAYO MORA", CALLE CHICHEN-ITZÁ No. 1101, MORELOS Fracc. 1a. Secc.	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	18 Jul 2019	31 Ago 2019	\$ 769,422.46	100%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS



AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

RECÁMARAS, TECHOS Y BAÑOS ADICIONALES

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO
FISMDF-0112-2019	CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 01-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	29 Jun 2019	26 Sep 2019	\$ 2,799,872.78	100%
FISMDF-0113-2019	CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 02-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	ROMO AGUILERA, SERGIO EDUARDO, I.C.	05 Jul 2019	02 Oct 2019	\$ 2,781,325.36	85%
FISMDF-0114-2019	CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 03-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	05 Jul 2019	02 Oct 2019	\$ 2,801,199.81	85%
FISMDF-0115-2019	CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 04-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	02 Jul 2019	29 Sep 2019	\$ 2,710,262.73	94%
FISMDF-0116-2019	CONSTRUCCIÓN DE 41 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 05-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	19 Jul 2019	16 Oct 2019	\$ 2,866,197.63	72%
FISMDF-0136-2019	CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.	23 Ago 2019	20 Nov 2019	\$ 2,869,824.48	15%
FISMDF-0137-2019	CONSTRUCCIÓN DE 37 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 02-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	DÁVILA RAMIREZ ARENTSEN, ING	06 Ago 2019	03 Nov 2019	\$ 2,671,199.41	62%
FISMDF-0138-2019	CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 03-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	07 Ago 2019	04 Nov 2019	\$ 2,228,490.68	50%
FISMDF-0139-2019	CONSTRUCCIÓN DE 29 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 04-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	23 Ago 2019	05 Nov 2019	\$ 2,077,988.06	35%
FISMDF-0140-2019	CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 05-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C.	06 Ago 2019	03 Nov 2019	\$ 2,818,522.19	45%
FISMDF-0141-2019	CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 06/07-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	06 Ago 2019	03 Nov 2019	\$ 1,928,099.39	33%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

RECÁMARAS, TECHOS Y BAÑOS ADICIONALES

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO
FISMDF-0144-2019	CONSTRUCCIÓN DE 33 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 08-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	09 Ago 2019	06 Nov 2019	\$ 2,370,156.81	45%
FISMDF-0146-2019	CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES (PROMEDIO 20 M2) ZONA 01-TF, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	JULIO CESAR BADILLO, I.C.	08 Ago 2019	05 Nov 2019	\$ 2,597,608.58	43%
FISMDF-0147-2019	CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	LUVI, S.A. DE C.V.	06 Ago 2019	03 Nov 2019	\$ 1,410,100.54	80%
FISMDF-0150-2019	CONSTRUCCIÓN DE 32 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 06-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	23 Ago 2019	05 Nov 2019	\$ 2,239,804.07	13%
FISMDF-0151-2019	CONSTRUCCIÓN DE 29 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 07-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C.	23 Ago 2019	05 Nov 2019	\$ 2,021,034.84	55%
FISMDF-0152-2019	CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 08-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	31 Ago 2019	13 Nov 2019	\$ 2,159,686.19	6%
FISMDF-0153-2019	CONSTRUCCIÓN DE 12 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 09-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES.	CALVILLO SILVA GREGORIO, I.C.	3 Sept 2019	1 Nov 2019	\$ 839,092.66	10%
FISMDF-0154-2019	CONSTRUCCIÓN DE 22 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 10-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	IGNACIO JIMENEZ ARMAS, ARQ.	23 Ago 2019	5 Nov 2019	\$ 1,530,528.65	25%
FISMDF-0155-2019	CONSTRUCCIÓN DE 16 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 11-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	28 Ago 2019	10 Nov 2019	\$ 1,110,630.08	35%
FISMDF-0167-2019	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, ZONA 10-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCIÓN I.C.	06 Sept 2019	04 Nov 2019	\$ 2,158,807.07	20%
FISMDF-0168-2019	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, ZONA 11-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V.	06 Sept 2019	04 Nov 2019	\$ 2,165,264.20	20%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019 RECÁMARAS, TECHOS Y BAÑOS ADICIONALES



**NOTA: 82 RECÁMARAS ESTAN TERMINADAS EN
PROCESO DE VERIFICACIÓN FINAL Y ENTREGA**

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO
FISMDF-0105-2019	MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 1 (VARIAS CALLES), , INSURGENTES Fracc.	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	26 Jul 2019	23 Sep 2019	\$ 1,171,157.91	90%
FISMDF-0106-2019	MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 2 (VARIAS CALLES), , INSURGENTES Fracc.	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	06 Ago 2019	04 Oct 2019	\$ 1,711,245.27	80%
FISMDF-0108-2019	MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 4, VARIAS CALLES, INSURGENTES Fracc.	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.	26 Jul 2019	23 Sep 2019	\$ 975,009.67	97%
FISMDF-0109-2019	MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 5 (VARIAS CALLES), , INSURGENTES Fracc.	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	08 Ago 2019	06 Oct 2019	\$ 1,296,728.28	85%
FISMDF-0110-2019	MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 6 (VARIAS CALLES), , INSURGENTES Fracc.	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	06 Ago 2019	04 Oct 2019	\$ 1,285,012.54	60%

AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO 2019 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019


SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRA TERMINADA 2019

DM-0023-2019 CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS LADO PONIENTE, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, S/N, COL. OBRAJE.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A DE C.V.

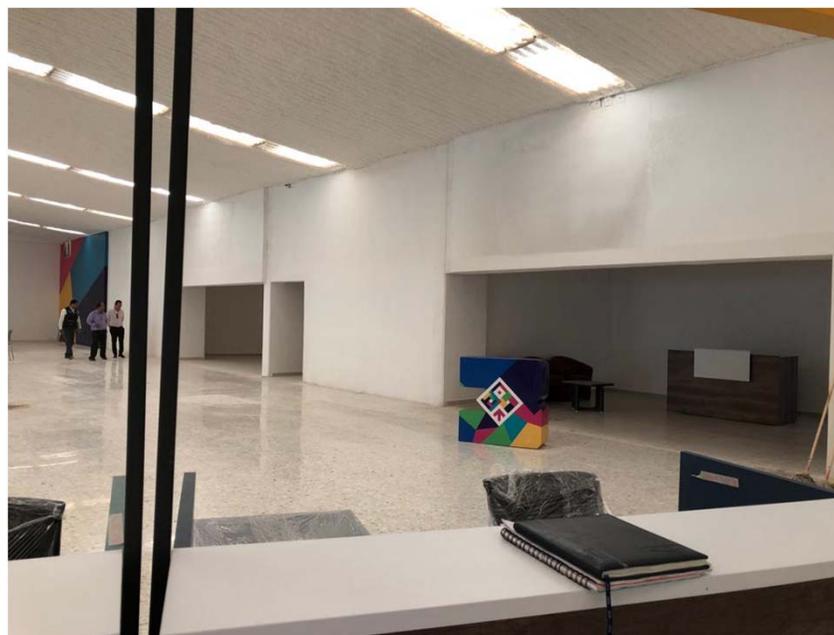

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL 2019
FECHA DE TERMINO: 18 DE AGOSTO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 2'500,000.00

AVANCE FISICO REAL 100.00%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRA TERMINADA 2019

FISMDF-0084-2019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SAN PABLO, TRAMO: ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME , FRACC. LOS PERICOS.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V.



FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO 2019
FECHA DE TÉRMINO: 07 DE AGOSTO 2019
TECHO FINANCIERO: \$ 1'069,161.72

AVANCE FISICO REAL 100.00%



SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2. TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Bacheo Asfáltico	172,120.83 m2
Pintura en Guarniciones	112,595.60 m
Pintura en Guiones	119,891.14 m
Pintura en cruces peatonales y flechas	11,284.66 m2
Pintura en Topes	8,803.56 m2
Rastreo y nivelación de calles y caminos	351,152.20 m2
Rehabilitación de Canchas Deportivas	1,538.54 m2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2. TRABAJOS EJECUTADOS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

VIALIDADES BACHEO

No.	VIALIDAD	TRAMO
1	AV. DE LOS MAESTROS	DE BLVD. SIGLO XXI A AV. CONVENCION
2	AV. CONVENCION	DE AV. LOPEZ MATEOS A AV. ALAMEDA
3	AV. INDEPENDENCIA	DE AV. AGUASCALIENTES A C. LUIS GIL
4	AV. HEROE INMORTAL	ESQ. AV. SIGLO XXI
5	AV. UNIVERSIDAD	DE CANAL INTERCEPTOR A BLV. COLOSIO
6	AV. AGUASCALIENTES	DE AV. HÉROE DE NACUZARI A AV. TECNOLÓGICO
7	AV. SIGLO XXI	DE BLV. GUADALUPANO A AV. GERONIMO DE LA CUEVA
8	AV. ARQUEROS	DE AV. CONVENCION A AV. AGUASCALIENTES
9	AV. PENSADORES MEXICANOS	C. LOMA EMPINADA Y VARIAS MAS
10	BLV. JUAN PABLO II	DE BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES A BLVD. SIGLO XXI
11	AV. JOSE MA CHAVEZ	DE PUERTA SATURNINA A AV. AGUASCALIENTES
12	AV. AGUASCALIENTES	DE AV. DE LOS MAESTROS A AV. JOSE MA CHAVEZ
13	AV. LAS AMERICAS	DE AV. AGUASCALIENTES A AV. CONVENCION
14	SALIDA A ZACATECAS	DE C. NIÑOS HEROES A C. AGLAYA
15	C. DEL REY	DE AV. MARIANO HIDALGO A C. DE LA TORRE
16	AV. MARIANO HIDALGO	DE AV. SIGLO XXI A C. LUISA FERNANDEZ VILLA
17	AV. PETROLEOS MEXICANOS	DE AV. CONVENCION A C. LIBERTAD
18	AV. SIGLO XXI	DE AV. TECNOLOCIO A BLVD. JOSE MA. CHÁVEZ



SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

VIALIDADES BACHEO

No.	VIALIDAD	TRAMO
19	AV. AGUASCALIENTES	DE BLV. GUADALUPANO A AV. CONSTITUCION
20	AV. GERONIMO DE LA CUEVA	AV. VALLE DE LOS ROMERO Y VARIAS MAS
21	AV. JULIO DIAZ TORRE	DE C. JESUS RIVERA FRANCO A PUERTA SATURNNA
22	AV. AGUASCALIENTES	DE BLV. GUADALUPANO A AV. TECNOLOGICO
23	AV. SIGLO XXI	DE V. JOSE MA CHAVEZ A BLV. JUAN PABLO II
24	BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES	DE BLV. JUAN PABLO II A AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ
25	AV. JOSE MA CHAVEZ LATERAL	DE C. CHARREADA A C. LA HERRADURA
26	AV. SIGLO XXI	DE BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES A C. JULIA NAVARRETE
27	AV. CANAL INTERCEPTOR	ESQ. AV. SIGLO XIX
28	C. CONVENCION INSURGENTES Y VARIAS CALLES MAS	INSURGENTES
29	BLV. MANUEL J. CLOUTHIER	DE BLV. COLOSIO A AV. ARROYO EL MOLINO
30	AV. JOSE DE JESUS GLZ	DE AV. ERMITA DE SAN SEBASTIAN A AV. JOSE FEMAT
31	AV. OJOCALIENTE	DE AV. ALAMEDA AV. BARBERENA VEGA
32	AV. TECNOLOGICO	DE AV. SIGLO XXI A AV. AGUASCALIENTES
33	AV. JOSE MA CHAVEZ	DE AV. PASEO DE LA CRUZ A AV. LOPEZ MATEOS
34	AV. HEROE DE NACUZARI	DE AV. CONVENCION A AV. SIGLO XXI
35	C. CONSTITUCION	DE AV. SIGLO XXI A C. HEROES DE CHAPULTEPEC
36	AV. AGUASCALIENTES LATERAL	DE SALIDA A ZACATECAS A AV. INDEPENDENCIA
37	C. YAXCHILAN	DE C. BONAMPAK A AV. MARIANO HIDALGO
38	BLV. GUADALUPANO	DE AV. SIGLO XXI A C. CULTURA OTOMI



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA URBANA 3. TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Rehabilitación de Banqueta	8,037.54 m2
Rehabilitación de Guarnición	1,804.04 ml



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA URBANA





TRABAJOS EN PROCESO

No.	NOMBRE Y UBICACIÓN
1	REHABILITACIÓN DE FINCA COLON No. 663 ZONA CENTRO
2	CALLE GUADALUPE No.150
3	REABILITACIÓN DE FINCA NIETO NO.655 BARRIO DE SAN MARCOS
4	REHABILITACIÓN DE FINCA EDUARDO J CORREA No. 217 BARRIO DE SAN MARCOS
5	REHABILITACIÓN TEMPLO AVE MARIA (FOREMOBA)



TEMPLO AVE MARIA



FINCA COLÓN No. 663



FINCA NIETO No.655



TRABAJOS EJECUTADOS

No.	NOMBRE Y UBICACIÓN
1	REHABILITACIÓN DE FINCA PEDRO PARGA No. 121, ZONA CENTRO
2	REHABILITACIÓN DE FINCA CALLE LIBERTAD No. 106; ZONA CENTRO
3	APOYO EN EL TEMPLO DE LA SALUD, BARRIO DE LA SALUD
4	REHABILITACIÓN DE FINCA HORNEDO No. 522; ZONA CENTRO
5	EMILIANO ZAPATA No.417
6	REHABILITACIÓN DE FINCA 16 DE SEPTIEMBRE No. 117
7	REHABILITACIÓN DE FINCA LARREATEGUI No. 754-758, ZONA CENTRO
8	REHABILITACIÓN DE FINCA HOSPITALIDAD No. 137 ZONA CENTRO
9	REHABILITACIÓN DE FINCA HORNEDO No.304, ZONA CENTRO
10	REHABILITACIÓN DE FINCA PRIMO VERDAD No.818,ZONA CENTRO



FINCAS PRGRAMADAS

No.	NOMBRE Y UBICACIÓN
1	REHABILITACIÓN DE FINCA 16 DE SEPTIEMBRE No.112
2	REHABILITACIÓN DE FINCA ALAMAN No. 257
3	REHABILITACION DE FINCA PRIMO VERDAD No. 303
4	REHABILITACIÓN DE FINCA 5 DE MAYO No.517 EL CAMPEADOR
5	REHABILITACIÓN DE FINCA HORNEDO No. 214



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EN PROCESO		
No.	NOMBRE Y UBICACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA
1	TIRADERO COTORINA LOS COYOTES II, UBICADO EN SALIDA MÉXICO, DESVIACIÓN CARRETERA 69 (COCA-COLA) KM 2.7, CAMINO DE TERRACERÍA (COORDENADAS Q 784094.84, E 2407380.26).	22,507.50 M3
TOTAL		22,507.50 M3



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EJECUTADOS			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
1	10766	J.N. IGNACIO FLORES MANUEL G. ESCOBEDO S/N, COL. HEROES	SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA PARA PORTICO DE ACCESO
2	11328	CCECATI # 172 MONROY # 216, ZONA CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE
3	9793	E.P. MANUEL FERNANDEZ C. CATARINO ARREOLA #44, FRACC. FERRONALES	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA PARA EL INTERIOR DE AULAS
4	8876	E.P. ENRIQUE GARCIA GALLEGOS C. ROSALIA MONROY S/N, FRACC. JOSE LOPEZ PORTILLO	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PISO.
5	11373	J.N. UNESCO C. UXMAL Y BONAMPAK S/N, INFONAVIT MORELOS	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EXTERIOR DE AULAS
6	10780	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA ALTAS CAPACIDADES (CEIPACCERRO DE LA JOYA S/N, FRACC. CEDAZO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO COLINDANTE DEL PLANTEL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EJECUTADOS			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
7	11083	J.N. EMMA GODOY, C. MARIA GUADALUPE MEDINA RAMIREZ S/N, FRACC. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS	APOYO CON PINTURA PARA AULAS
8	10522	E.P. JOSE MARIA IGLESIAS, C. MAR DE GALILEA #197, FRACC. OLIVARES SANTANA	SUMINISTRO DE PINTURA PARA AULAS Y CONCERTINA EN BARDA PERIMETRAL
9	10853	E.P VALENTIN GOMEZ FARIAS, C. VALENTIN GOMEZ FARIAS # 314, BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MUROS EXTERIORES DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BANCAS METALICAS.
10	10698	ESC. SEC. TECNICA # 31, C. GALERIAS S/N, FRACC. VERSALLES	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS.
11	8725	E.P. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, AV. DIAMANTE S/N, COM. NORIAS DE OJOCALIENTE	APOYO CON PINTURA PARA MUROS DE AULAS Y FACHADA, ADEMAS DE APLANADO EN BARDA PERIMETRAL.
12	1344	E.P. DERECHOS HUMANOS, C. . CANARIO # 310, FRACC. POTREROS DEL OESTE	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN AREA DE DIRECCION Y BAÑOS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EJECUTADOS			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
13	10692	TELE SECUNDARIA No 67 " MIGUEL BARRAGAN", DOMICILIO CONOCIDO, COMUNIDAD DE POCITOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS
14	11419	ESC. NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGS. " PROF. JOSE SANTOS VALDES", AV. NAZARIO ORTIZ GARZA S/N, COL. INDECO	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS
15	10264	COLEGIO MANO AMIGA, ARRAYAN # 101, FRACC. LOS LAURELES	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PISO DE CEMENTO
16	11380	J.N. JOSE VASCONCELOS, C. NORIAS DEL MACHO S/N, COM. NORIAS DEL CEDAZO	APOYO CON PINTURA PARA MUROS
17	11925	E.P. FELIPE ANGELES, C. ARTICULO 35 S/N, FRACC. SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MUROS DE AULAS
18	10456	J.N. MOISES SAENZ GARZA, C. SANTA MARIA DE GALLARDO # 274, FRACC. OJOCALIENTE	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE MODULO DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EJECUTADOS			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
19	12193	ESC. SEC. GRAL. # 24 "JOSÉ GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ", AV. REVOLUCION S/N, COM. CALVILLITO	CERCAR CON MALLA CICLONICA UNA PARTE DEL PERIMETRO DE CANCHA DE BASQUETBOL.
20	11439	E.P. PRESIDENTES DE MEXICO, C. AQUILES ELORDY #1015, FRACC. SAN MARCOS	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MUROS, SOLO FALTA PINTAR DETALLES.
21	11869	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/1 "LIC. JESUS REYES HEROLES", C. NAZARIO ORTIZ GARZA S/N, COL. INDECO	SUM. E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS.

TRABAJOS EN PROCESO			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
22	4547	J.N. 19 DE MARZO DE 1977	SUMINISTRO DE PINTURA EN AULAS, JUEGOS Y HERRERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RODAPIE EN ARENERO
23	8665	E.P. JOSE MARIA MORELOS	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MUROS DE AULAS
24	4667	ESC. SEC. GRAL. # 6 JOSE GUADALUPE POSADA AGUILAR	SUMINISTRO DE PINTURA PARA AULAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE CISTERNA Y PISO DE CEMENTO.
25	11431	E.P. MARIANO JIMENEZ	APOYO CON PINTURA PARA FACHADA EN MURO PERIMETRAL Y ELEMENTOS METALICOS
26	9978	E.P. ANTONIO LANDIN RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE DESAYUNADOR METALICO Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN PARA PISO DE CEMENTO.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EN PROCESO			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
27	10456	J.N. MOISES SAENZ GARZA, C. SANTA MARIA DE GALLARDO # 274, FRACC. OJOCALIENTE	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE MODULO DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO.
28	12193	ESC. SEC. GRAL. # 24 "JOSÉ GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ", AV. REVOLUCION S/N, COM. CALVILLITO	CERCAR CON MALLA CICLONICA UNA PARTE DEL PERIMETRO DE CANCHA DE BASQUETBOL.
29	11869	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/1 "LIC. JESUS REYES HEROLES", C. NAZARIO ORTIZ GARZA S/N, COL. INDECO	SUM. E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS.
30	12029	J.N. FELIPE COSIO, C. ENRIQUE OLIVARES SANTANA S/N, FRACC. SAN FRANCISCO DEL ARENAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS.
31	12031	E.P. MELQUIADES MORENO, C. IGNACIO ZARAGOZA 505-A, ZONA CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAYUNADORES METALICOS
32	11594	J.N. MA. DEL CONSUELO RAMIREZ ACOSTA, C. SANTIAGO S/N, FRACC. VISTAS DE ORIENTE	PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y ELEMENTOS METALICOS, ADEMÁS DE REENIVELACION DE AREA DE JUEGOS . SE ESTA CONSTRUYENDO PISO DE CONCRETO.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
5. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS

TRABAJOS EN PROCESO			
No.	FOLIO	NOMBRE Y UBICACIÓN	APOYO
33	12854	E.P. MIGUEL HIDALGO, DOM. CONOCIDO, DOM. CONOCIDO	APOYO CON PINTURA PARA MUROS
34	12391	E.P. J. SANTOS VALDEZ GARCÍA, . C. MAR CARIBE # 203, FRACC. COLINAS DEL RÍO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA PARA ENJARRAR BARDA PERIMETRAL
35	12968	J.N. JERÓNIMO DE LA CUEVA, C. . DIAGONAL ALFIL # 101, FRACC. FUNDADORES	APOYO CON PINTURA PARA MUROS
36	12966	J.N. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, C. VALENTE QUINTANA # 101, COL. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	APOYO CON PINTURA PARA MUROS
37	13136	J.N. ADELINA ZENDEJAS GOMEZ, C. ALTEA # 101, FRACC. LOMAS DEL CHAPULIN	APOYO CON PINTURA PARA ELEMENTOS METALICOS Y MUROS
38	12325	ESC. SEC. GRAL. # 41 " JOSEPH LANCASTER", C. VILLA DE LOURDES # 202, FRACC. VILLA LAS PALMAS	APOYO CON PINTURA PARA AULAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

6. OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR INICIAR

***ADECUACIÓN DE PLAZA, CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAM, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COL. OBRAJE.**

***CONSTRUCCIÓN DE 16 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 09-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

**PROGRAMA FISMDF
INVERSIÓN \$ 3'098,622.45**

Gracias

